


INFORMACIJA
O UTROŠKU SREDSTAVA U 2023. GODINI
KOJIMA SU FINANSIRANI PROJEKTI UKLJUČENI U
PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

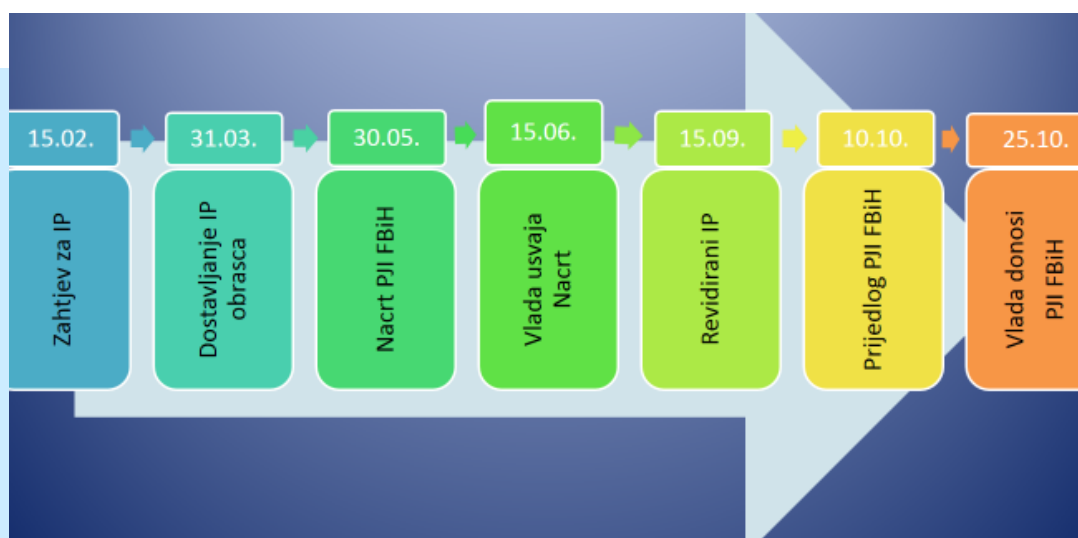

Sarajevo, Mart 2024.

Sadržaj

UVOD.....	1
REALIZACIJA PROJEKATA U 2023. GODINI.....	1
REALIZACIJA PROJEKATA PO SEKTORIMA.....	2
REALIZACIJA PROJEKATA PO LOKACIJI IMPLEMENTACIJE	3
ZAVRŠENI PROJEKTI	3
PREGLED IMPLEMENTACIJE PROJEKATA U 2023. GODINI.....	4
TROŠKOVI JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKATA.....	18
ODSTUPANJE REALIZACIJE PROJEKATA OD PLANA.....	21

UVOD

U skladu sa Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija («Službene novine Federacije BiH», broj 106/14, 27/19, 104/22 i 17/24) Federalno ministarstvo finansija ima obavezu da, najmanje jednom godišnje, informira Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o utrošku sredstava kojima se finansiraju projekti uključeni u Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine.

Informacija o utrošku sredstava kojima su finansirani projekti uključeni u PJI Federacije priprema se na osnovu podataka unesenih u PIMIS sistem (Informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama), a nakon što jedinice za upravljanje projektom i koordinatori¹ Federalnom ministarstvu finansija dostave potpisan i ovjeren IP obrazac. Unos podataka u PIMIS sistem i dostavljanje IP obrasca se, u skladu sa članom 17. Uredbe, vrši kvartalno.

Odgovornost za realizaciju projekata, upravljanje domaćim i stranim sredstvima namijenjenim realizaciji projekata, te pravovremeno i tačno izvještavanje o napretku u realizaciji projekata imaju jedinice za upravljanje projektom².

REALIZACIJA PROJEKATA U 2023. GODINI

Projekti u implementaciji obuhvataju, kako projekte čija je realizacija u toku, tako i projekte za čiju su realizaciju osigurani izvori finansiranja ili je izvjesno da će biti osigurana sredstva za njihovo finansiranje. Projekat koji se finansira iz više izvora tretira se kao projekat u implementaciji ukoliko su efektivna sredstva iz bilo kog od izvora.

Tabela 1. Realizacija projekata u 2023. godini, zbirno, po načinu finansiranja, u mil. KM

Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno utrošeno do 31.12.2023.
Budžet FBiH	515,96	176,13	50,52	226,65
Budžet kantona	0,93	0,24	0,00	0,24
Budžet općine	59,48	12,66	0,34	13,00
Vlastita sredstva	1.661,83	513,54	120,80	634,34
Domaći krediti	148,28	148,28	0,00	148,28
Domaći grantovi	8,20	4,92	0,12	5,04
Ino krediti	3.654,53	1.450,07	185,25	1.635,32
Ino grantovi	355,61	103,43	20,55	123,98
Ukupno	6.404,82	2.409,27	377,58	2.786,84


¹ Koordinator je zaposlenik federalnog organa uprave, agencije i javnog preduzeća ovlašten za unos podataka o projektima u PIMIS sistem na nivou Federacije

² Jedinica za upravljanje projektom u smislu navedene Uredbe je organizaciona jedinica osnovana u okviru federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, jedinice lokalne samouprave, agencije, odnosno javnog preduzeća i odgovorna je za implementaciju projekta koji je odobrila Vlada Federacije.

REALIZACIJA PROJEKATA PO SEKTORIMA

Tabela 2. Realizacija projekata po sektorima, u mil. KM

Sektor	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno utrošeno do 31.12.2023.
Cestovni saobraćaj	2.980,83	1.467,32	333,89	1.801,21
Proizvodnja i snabdijevanje energijom	2.487,48	412,58	4,72	417,30
Vodosnabdijevanje i sanitacija	322,30	146,50	6,17	152,66
Željeznički saobraćaj	216,66	207,25	0,00	207,25
Zračni saobraćaj	120,00	12,00	0,00	12,00
Humanitarna pomoć u rekonstrukciji i obnovi	93,23	54,27	16,05	70,31
Građevinarstvo	66,43	22,46	8,71	31,17
Poljoprivreda	50,67	33,76	3,78	37,54
Višesektorske aktivnosti	38,84	36,65	0,00	36,65
Vladin sektor i civilno društvo	16,27	7,63	4,26	11,90
PTT saobraćaj	9,11	8,85	0,00	8,85
Ostale usluge i socijalna infrastruktura	3,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno	6.404,82	2.409,27	377,58	2.786,84

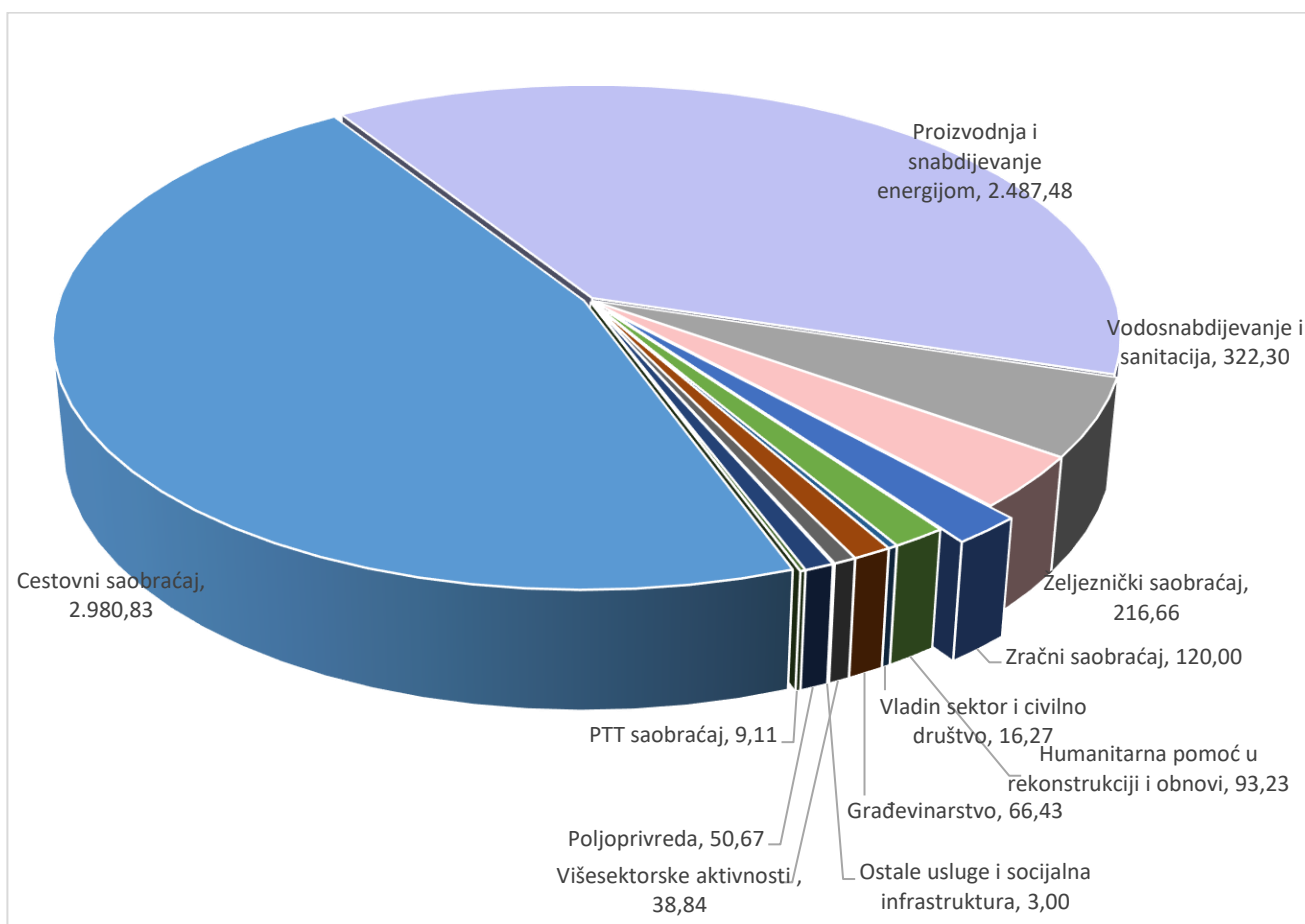

REALIZACIJA PROJEKATA PO LOKACIJI IMPLEMENTACIJE

Tabela 3. Realizacija projekata po lokaciji implementacije, u mil. KM

Lokacija implementacije	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno utrošeno do 31.12.2023.
Tuzlanski kanton	1.910,23	344,79	7,49	352,28
Zeničko - dobojski kanton	1.908,30	778,88	200,16	979,04
Hercegovačko-neretvanski kanton	750,25	251,63	52,15	301,68
Federacija BiH	738,69	589,83	50,32	642,25
Kanton Sarajevo	283,75	247,69	7,83	255,52
Kanton 10	233,96	14,15	0,22	14,37
Unsko-sanski kanton	197,79	27,29	0,48	27,77
Bosansko-podrinjski kanton	176,55	92,19	30,44	122,63
Srednjobosanski kanton	169,64	39,37	28,04	67,41
Posavski kanton	18,42	11,81	0,25	12,05
Zapadnohercegovački kanton	17,23	11,64	0,21	11,85
Ukupno	6.404,82	2.409,27	377,58	2.786,84

ZAVRŠENI PROJEKTI

Tabela 4. Projekti završeni u 2023. godini, u mil. KM

Implementator		Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Ukupno utrošeno do 31.12.2023.
1	Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	Projekat zaštite od poplava Drine	19,14	19,14
2	Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica	Regionalni stambeni program	55,68	50,85
3	JP Autoceste FBiH	Izgradnja autoceste na koridoru Vc, poddionica Donja Gračanica (tunel Pečuj) -Klopče, dionica Nemila – Zenica (Klopče)	363,22	360,36
4	JP Autoceste FBiH	Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, poddionica Buna-Počitelj, dionica Mostar jug-Zvirovići	61,11	59,58
5	JP Autoceste FBiH	Izgradnja autoceste na koridoru Vc, dionica Tarčin-Ivan	344,09	343,14
6	JP Ceste Federacije BiH	Program modernizacije magistralnih cesta u F BiH - Sanacija mostova	15,65	15,65
7	JP Međunarodni aerodrom Sarajevo	Proširenje Terminala B	38,00	38,00
8	JP Međunarodni aerodrom Sarajevo	Proširenje platforme - I faza	6,30	6,27
9	JP BH Pošta	Uvođenje ekoloških vozila u JP BH Pošta d.o.o Sarajevo	2,50	
10	JP BH Pošta	Infrastuktura javnih ključeva za izdavanje kvalificirane potvrde - kvalificiranog certifikata (digitalni potpis)	2,91	

Pregled implementacije projekata u 2023. godini, u KM

Implementator	Naziv projekta	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u tekućoj godini	Utrošeno ukupno do 31.12.2023.
Federalno ministarstvo okoliša i turizma	Izgradnja međuopćinske sanitarne deponije,separacija 1, Živinice, Banovići i Kladanj	Živinice	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - potrošačka jedinica	354.000	354.000		354.000
					Budžet kantona - potrošačka jedinica	932.400	241.400		241.400
			Ino sredstva	Grant	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	293.374	83.254		83.254
					Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA)	4.889.575		1.721.719	1.721.719
				Kredit	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	9.779.150	9.779.150		9.779.150
	Izgradnja međuopćinske sanitarne deponije,separacija 1, Živinice, Banovići i Kladanj					16.248.499	10.457.804	1.721.719	12.179.523
	Sanacija deponije "Vaganac"	Bosanski Petrovac	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	1.590.247	39.759		39.759
	Sanacija deponije "Vaganac"					1.590.247	39.759		39.759

Implementator	Naziv projekta	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u tekućoj godini	Utrošeno ukupno do 31.12.2023.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	Izgradnja Regionalnog vodovoda "Plava voda"	Više općina Srednjobosanskog kantona	Ino sredstva	Kredit	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	7.507.500	136.178		136.178
					Razvojna banka vijeća Europe (CEB)	7.507.500	562.832		562.832
		Više općina Zeničko-dobojskog kantona	Ino sredstva	Kredit	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	13.942.500	252.901		252.901
					Razvojna banka vijeća Europe (CEB)	13.942.500	1.045.260		1.045.260
	Izgradnja Regionalnog vodovoda "Plava voda"					42.900.000	1.997.171		1.997.171
	Sakupljanje i tretman otpadnih voda Zenica	Zenica	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	1.955.830			
				Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	1.466.608			
			Ino sredstva	Grant	Njemački kreditni zavod za obnovu F/M (KfW)	26.436.361	1.649.416	3.112.585	4.762.001
					Vlada Švajcarske	9.290.193	1.133.249	218.522	1.351.771
	Sakupljanje i tretman otpadnih voda Zenica					39.148.992	2.782.665	3.331.107	6.113.772
	Program vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda Bosna II - komponenta Zenica	Zenica	Ino sredstva	Grant	Njemački kreditni zavod za obnovu F/M (KfW)	1.465.822	1.465.822		1.465.822
					Vlada Švajcarske	9.711.531	9.711.531	626.008	10.337.539
				Kredit	Njemački kreditni zavod za obnovu F/M (KfW)	9.290.193	9.290.193		9.290.193
Program vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda Bosna II - komponenta Zenica					20.467.546	20.467.546	626.008	21.093.554	

Implementator	Naziv projekta	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u tekućoj godini	Utrošeno ukupno do 31.12.2023.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH - WATSAN FBiH	Bosanska Krupa	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	845.369			
				Grant	Fondovi vlastito učešće	281.790	281.790		281.790
			Ino sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	1.356.432	1.356.432		1.356.432
				Kredit	Europska investiciona banka (EIB)	3.536.325	228.165	174.500	402.665
		Bosanski Petrovac	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	213.367	440.003		440.003
				Grant	Fondovi vlastito učešće	200.000	143.905		143.905
			Ino sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	1.028.646	1.028.646		1.028.646
				Kredit	Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA)	1.838.480		63.194	63.194
		Bosansko Grahovo	Domaća sredstva	Budžet	Europska investiciona banka (EIB)	2.501.061	1.918.424		1.918.424
				Grant	Budžet općine - sufinansiranje	298.978			0
			Ino sredstva	Grant	Fondovi vlastito učešće	61.847	61.846		61.846
				Kredit	Europska komisija (EC)-IPA	619.718	619.718		619.718
		Doboj Jug	Domaća sredstva	Grant	Europska investiciona banka (EIB)	1.505.633	1.418.040		1.418.040
				Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	859.413			0
			Ino sredstva	Grant	Fondovi vlastito učešće	250.000			0
				Kredit	Europska komisija (EC)-IPA	707.876	707.876		707.876
		Federacija BiH	Domaća sredstva	Grant	Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA)	35.882	35.882		35.882
				Kredit	Europska investiciona banka (EIB)	1.755.105	417.581		417.581
			Ino sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	844.250	246.205	14.417	260.622
				Grant	Budžet općine - sufinansiranje	346.182	13.348		13.348
		Glamoč	Domaća sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	618.042	618.042		618.042
				Kredit	Europska investiciona banka (EIB)	1.502.077	1.084.873		1.084.873
			Ino sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	1.901.796	973.205		973.205
				Grant	Fondovi vlastito učešće	399.999	399.998		399.998
		Gornji Vakuf	Domaća sredstva	Grant	Europska investiciona banka (EIB)	3.093.971	2.894.051		2.894.051
				Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	1.095.830	563.403		563.403
			Ino sredstva	Grant	Fondovi vlastito učešće	580.000	319.970		319.970
				Kredit	Europska komisija (EC)-IPA	837.233	837.233		837.233
		Gračanica	Domaća sredstva	Grant	Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA)	768.812	768.812		768.812
				Kredit	Europska investiciona banka (EIB)	4.450.137	2.236.019		2.236.019
			Ino sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	6.277.417	1.108.116		1.108.116
				Grant	Fondovi vlastito učešće	350.000			0
		Jajce	Domaća sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	2.562.109	2.562.109		2.562.109
				Kredit	Europska investiciona banka (EIB)	8.000.000	4.488.719		4.488.719
			Ino sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	5.828.617	4.666.813		4.666.813
				Grant	Fondovi vlastito učešće	150.000	181.602		181.602
		Konjic	Domaća sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	2.793.500	2.793.500		2.793.500
				Kredit	Europska investiciona banka (EIB)	7.500.000	6.328.710	25.332	6.354.042
			Ino sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	3.039.633			0
				Grant	Fondovi vlastito učešće	300.000	225.282		225.282
		Lukavac	Domaća sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	762.068	762.068		762.068
				Kredit	Europska investiciona banka (EIB)	6.552.030	1.748.325		1.748.325

Implementator	Naziv projekta	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u tekućoj godini	Utrošeno ukupno do 31.12.2023.		
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH - WATSAN FBiH	Mostar	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	5.232.948	1.417.918		1.417.918		
				Grant	Fondovi vlastito učešće	450.000	452.542		452.542		
			Ino sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	4.748.596	4.748.596		4.748.596		
					Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA)	2.933.745	1.760.098		1.760.098		
				Kredit	Europska investiciona banka (EIB)	15.646.640	14.135.715		14.135.715		
		Orašje	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	3.680.234	633.730		633.730		
				Grant	Fondovi vlastito učešće	1.465.726	440.001	89.220	529.221		
			Ino sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	1.007.609	1.007.609		1.007.609		
					Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA)	20.836	20.836		20.836		
				Kredit	Europska investiciona banka (EIB)	5.867.490	3.380.043		3.380.043		
		Prozor	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	4.203.593	753.354		753.354		
				Grant	Europska komisija (EC)-IPA	2.499.938	2.499.938		2.499.938		
			Ino sredstva	Kredit	Europska investiciona banka (EIB)	8.500.037	7.532.000		7.532.000		
		Tešanj	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	9.301.249	880.006		880.006		
				Grant	Fondovi vlastito učešće	1.785.000	1.788.873		1.788.873		
			Ino sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	2.112.650	2.112.650		2.112.650		
				Kredit	Europska investiciona banka (EIB)	9.500.000	5.068.844		5.068.844		
		Tomislavgrad	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	1.935.926	520.994		520.994		
				Grant	Fondovi vlastito učešće	250.000	352.003	26.215	378.218		
			Ino sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	3.218.912	3.218.912		3.218.912		
					Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA)	993.562			0		
				Kredit	Europska investiciona banka (EIB)	7.823.320	5.322.869	97.113	5.419.982		
		Usora	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	355.117			0		
				Grant	Fondovi vlastito učešće	250.000			0		
			Ino sredstva	Kredit	Europska investiciona banka (EIB)	1.417.341	201.709		201.709		
		Velika Kladuša	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	9.143.982			0		
			Ino sredstva	Kredit	Europska investiciona banka (EIB)	6.454.239	1.397.826		1.397.826		
		Čitluk	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	151.371			0		
				Grant	Fondovi vlastito učešće	200.000			0		
			Ino sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	493.750	493.750		493.750		
				Kredit	Europska investiciona banka (EIB)	1.200.000	942.139		942.139		
		Široki Brijeg	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	2.243.038	440.003		440.003		
				Grant	Fondovi vlastito učešće	1.228.187	275.620		275.620		
			Ino sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	1.352.984	1.352.984		1.352.984		
				Kredit	Europska investiciona banka (EIB)	5.828.000	3.119.999		3.119.999		
		Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH - WATSAN FBiH						201.945.645	110.750.272	489.991	111.240.263

Implementator	Naziv projekta	Lokacija	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u tekućoj godini	Utrošeno ukupno do 31.12.2023.
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove	Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina	Federacija Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	0			0
				Vlastita sredstva	Ostala domaća sredstva	1.661.545	339.446	758.811	1.098.257
			Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka (WB) osim IDA	2.885.508	2.073.367	672.057	2.745.424
		Više općina Bosansko-podrinjskog kantona	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	72.500	22.500		22.500
				Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka (WB) osim IDA	254.113	137.462	43.925
		Više općina Hercegovačko-neretvanskog kantona	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	84.990	64.000	31.417	95.417
				Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka (WB) osim IDA	1.074.626	665.211	444.497
		Više općina Kantona 10	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	3.000	2.000		2.000
				Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka (WB) osim IDA	381.678	205.146	97.161
		Više općina Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	74.670	22.500	14.000	36.500
				Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka (WB) osim IDA	2.096.468	619.659	244.737
		Više općina Posavskog kantona	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	13.000		42.900	42.900
				Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka (WB) osim IDA	189.145	151.602	116.893
		Više općina Srednjobosanskog kantona	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	73.000	26.000	31.950	57.950
				Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka (WB) osim IDA	1.213.677	586.184	241.350
		Više općina Tuzlanskog kantona	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	98.500	60.049	135.397	195.446
				Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka (WB) osim IDA	2.271.705	1.212.561	676.066
		Više općina Unsko-sanskog kantona	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	64.510	13.000	40.250	53.250
				Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka (WB) osim IDA	1.375.333	380.208	145.572
		Više općina ZHK	Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka (WB) osim IDA	489.012	358.084	207.253	565.337
				Više općina Zeničko-dobojskog kantona	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	85.500	35.500
		Ino sredstva	Kredit			Svjetska banka (WB) osim IDA	1.810.591	659.789	274.796
		Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina						16.273.071	7.634.268

Implementator	Naziv projekta	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u tekućoj godini	Utrošeno ukupno do 31.12.2023.
Federalno ministarstvo okoliša i turizma	Obnova dvorca Lotara Berkse u sastavu nacionalnog spomenika "Stari grad Ostrožac"	Cazin	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje IPA projekata	2.500.000			
			Ino sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	500.000			
	Obnova dvorca Lotara Berkse u sastavu nacionalnog 3.000.000spomenika "Stari grad Ostrožac"					3.000.000			

Implementator	Naziv projekta	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u tekućoj godini	Utrošeno ukupno do 31.12.2023.
JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine	Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, poddionica Nemila - Vranduk, dionica Nemila - Zenica (Klopče)	Zenica	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	108.886.688	16.073.775	4.643.393	20.717.168
			Ino sredstva	Kredit	Kuvajt	111.482.310	24.291.026	26.432.021	50.723.047
	Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, poddionica Nemila - Vranduk, dionica Nemila - Zenica (Klopče)					220.368.998	40.364.801	31.075.414	71.440.215
	Izgradnja autoceste na koridoru Vc, poddionica Počitelj-Zvirovići, dionica Mostar jug - Zvirovići	Više općina Hercegovačko-neretvanskog kantona	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	43.796.302	32.591.203	10.385.457	42.976.660
			Ino sredstva	Grant	Europska investiciona banka (EIB)	9.779.150	8.775.373		8.775.373
	Kredit	Europska investiciona banka (EIB)		195.583.000	121.323.815	40.389.891	161.713.706		
	Izgradnja autoceste na koridoru Vc, poddionica Počitelj-Zvirovići, dionica Mostar jug - Zvirovići					249.158.452	162.690.391	50.775.348	213.465.739
	Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, poddionica Kvanj-Buna, Dionica Mostar jug -Zvirovići	Više općina Hercegovačko-neretvanskog kantona	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	55.970.375	3.549.515	2.760	3.552.275
			Ino sredstva	Grant	Europska investiciona banka (EIB)	85.706.927			
	Kredit	Europska investiciona banka (EIB)		221.667.215					
	Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, poddionica Kvanj-Buna, Dionica Mostar jug -Zvirovići					363.344.517	3.549.515	2.760	3.552.275
	Izgradnja autoceste na koridoru Vc, Poddionica Vranduk- Ponirak, dionica Nemila- Zenica (Klopče)	Zenica	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	223.484.228	68.826.901	21.175.532	90.002.433
			Ino sredstva	Kredit	OPEC fond za međunarodni razvoj (OFID)	141.785.623	92.722.627		92.722.627
	Izgradnja autoceste na koridoru Vc, Poddionica Vranduk- Ponirak, dionica Nemila- Zenica (Klopče)					365.269.851	161.549.528	21.175.532	182.725.060
	Izgradnja autoceste na koridoru Vc, poddionica Ponirak- Vraca (tunel Zenica), dionica Nemila- Zenica (Klopče)	Zenica	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	24.138.086	13.465.340	32.440.704	45.906.044
			Ino sredstva	Grant	Europska investiciona banka (EIB)	37.160.770	9.584.849	11.291.123	20.875.972
	Kredit	Europska investiciona banka (EIB)		97.791.500	62.586.560		62.586.560		
	Izgradnja autoceste na koridoru Vc, poddionica Ponirak- Vraca (tunel Zenica), dionica Nemila- Zenica (Klopče)					159.090.356	85.636.749	43.731.827	129.368.576
	Izgradnja autoceste na koridoru Vc, dionica Poprikuše- Nemila	Žepče	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	230.954.284	42.952.737	31.976.142	74.928.879
			Ino sredstva	Grant	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	80.529.344	4.168.887	2.721.340	6.890.227
				Kredit	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	119.636.407	119.636.407	1.000.762	120.637.169
					Europska investiciona banka (EIB)	149.229.829	85.858.826	63.256.418	149.115.244
	Izgradnja autoceste na koridoru Vc, dionica Poprikuše- Nemila					580.349.864	252.616.857	98.954.662	351.571.519
	Izgradnja Brze ceste Prača - Goražde, Lot 1 tunel Hranjen - Faza I	Više općina Bosansko-podrinjskog kantona	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - potrošačka jedinica	135.177.938	74.577.938	24.054.070	98.632.008
				Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	38.783.367	15.242.488	6.338.039	21.580.527
	Izgradnja Brze ceste Prača - Goražde, Lot 1 tunel Hranjen - Faza I					173.961.305	89.820.426	30.392.109	120.212.535

Implementator	Naziv projekta	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u tekućoj godini	Utrošeno ukupno do 31.12.2023.
JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine	Izgradnja brze ceste Mostar - Široki Brijeg - granica R Hrvatske, poddionica sjeverna obilaznica Mostara	Mostar	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	10.049.759	10.049.759		10.049.759
	Izgradnja brze ceste Mostar - Široki Brijeg - granica R Hrvatske, poddionica sjeverna obilaznica Mostara					10.049.759	10.049.759		10.049.759
	Izgradnja brze ceste Lašva - Nević polje	Više općina Srednjobosanskog kantona	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - potrošačka jedinica	85.505.345	24.181.597	23.525.563	47.707.160
				Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	11.220.909	1.415.912	4.231.668	5.647.580
	Izgradnja brze ceste Lašva - Nević polje					96.726.254	25.597.509	27.757.231	53.354.740
	Izgradnja autoceste na koridoru Vc, poddionica Tunel Zenica-Donja Gračanica (tunel Pečuj), dionica Nemila-Zenica (Klopče)	Zenica	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	36.974.756	36.912.411		36.912.411
			Ino sredstva	Grant	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	17.006.560	16.967.520		16.967.520
				Kredit	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	101.219.687	101.219.687		101.219.687
Izgradnja autoceste na koridoru Vc, poddionica Tunel Zenica-Donja Gračanica (tunel Pečuj), dionica Nemila-Zenica (Klopče)					155.201.003	155.099.618		155.099.618	

Implementator	Naziv projekta	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u tekućoj godini	Utrošeno ukupno do 31.12.2023.
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija	Sarajevska obilaznica I-III faza	Više općina Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - javne investicije	40.224.333	40.224.333		40.224.333
				Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	494.125	494.125		494.125
			Ino sredstva	Grant	Europska investiciona banka (EIB)	697.899	697.899		697.899
				Kredit	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	72.784.000	72.784.000		72.784.000
					Europska investiciona banka (EIB)	67.427.619	67.427.619		67.427.619
					OPEC fond za međunarodni razvoj (OFID)	30.807.478	30.807.478		30.807.478
	Sarajevska obilaznica I-III faza					212.435.454	212.435.454		212.435.454
	Aeroderom Bihać, izgradnja aerodromskog kompleksa na području prigradskog naselja grada Bihaća (naselje Golubić)	Bihać	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - potrošačka jedinica	120.000.000	12.000.000		12.000.000
	Aeroderom Bihać, izgradnja aerodromskog kompleksa na području prigradskog naselja grada Bihaća (naselje Golubić)					120.000.000	12.000.000		12.000.000

Implementator	Naziv projekta	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u tekućoj godini	Utrošeno ukupno do 31.12.2023.
JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine	Izgradnja ceste M-17.3 Neum-Stolac	Federacija Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - javne investicije	466.716	466.716		466.716
				Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	12.632.212	12.632.212	416.918	13.049.130
			Ino sredstva	Kredit	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	879.537	879.537		879.537
					Europska investiciona banka (EIB)	39.801.932	39.406.032	515.428	39.921.460
					Svjetska banka (WB) osim IDA	45.504.104	44.147.004	2.918.799	47.065.803
	Izgradnja ceste M-17.3 Neum-Stolac					99.284.501	97.531.501	3.851.145	101.382.646
	Program modernizacije magistralnih cesta u F BiH - Rekonstrukcija ceste i kolovozne konstrukcije, korekcija osovine	Federacija Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	1.704.408	1.704.408	61.395	1.765.803
			Ino sredstva	Kredit	Europska investiciona banka (EIB)	7.488.985	6.672.685	155.776	6.828.461
	Svjetska banka (WB) osim IDA	6.010.606			5.919.906	312.436	6.232.342		
	Program modernizacije magistralnih cesta u F BiH - Rekonstrukcija ceste i kolovozne konstrukcije, korekcija osovine					15.203.999	14.296.999	529.607	14.826.606
	Program modernizacije magistralnih cesta u FBIH - Izgradnja traka za spora vozila	Federacija Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	2.401.529	2.401.529	117.894	2.519.423
			Ino sredstva	Kredit	Europska investiciona banka (EIB)	15.148.443	13.465.943	653.269	14.119.212
	Svjetska banka (WB) osim IDA	18.165.599			16.483.099	4.223.264	20.706.363		
	Program modernizacije magistralnih cesta u FBIH - Izgradnja traka za spora vozila					35.715.571	32.350.571	4.994.427	37.344.998
	Program modernizacije magistralnih cesta u F BiH - Sanacija tunela	Federacija Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	2.191.225	2.191.225	11.500	2.202.725
					Ino sredstva	Kredit	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	7.863.770	7.863.770
			Europska investiciona banka (EIB)	14.154.485			14.154.485	4.640	14.159.125
			Svjetska banka (WB) osim IDA	20.186.256			20.186.256	7.830	20.194.086
	Program modernizacije magistralnih cesta u F BiH - Sanacija tunela					44.395.736	44.395.736	23.970	44.419.706
	Izgradnja brze ceste Lašva-Nević Polje - prolaz kroz poslovnu zonu Vitez	Vitez	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - javne investicije	34.000.000	9.180	9.180	18.360
				Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	30.755	28.120	2.635	30.755
	Izgradnja brze ceste Lašva-Nević Polje - prolaz kroz poslovnu zonu Vitez					34.030.755	37.300	11.815	49.115
	Poddionica Šiški Brod-Đurđevik na trasi ceste Tuzla-Sarajevo	Više općina Tuzlanskog kantona	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - javne investicije	40.000.000	5.927.076	1.257.937	7.185.013
				Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	112.185	112.185		112.185
	Poddionica Šiški Brod-Đurđevik na trasi ceste Tuzla-Sarajevo					40.112.185	6.039.261	1.257.937	7.297.198

Implementator	Naziv projekta	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u tekućoj godini	Utrošeno ukupno do 31.12.2023.
JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine	Spoj magistralnih cesta M17 i M17.4, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta i rasvjeta na M17 Ortiješ u gradu Mostaru	Mostar	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - javne investicije	13.000.000	7.696.986	437.536	8.134.522
				Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	171.688	171.688		171.688
	Spoj magistralnih cesta M17 i M17.4, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta i rasvjeta na M17 Ortiješ u gradu Mostaru					13.171.688	7.868.674	437.536	8.306.210
	Izgradnja gradskog autoputa u Sarajevu, dionica Stup-Buća Potok	Više općina Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - javne investicije	14.000.000	752.968	125.591	878.559
	Izgradnja gradskog autoputa u Sarajevu, dionica Stup-Buća Potok					14.000.000	752.968	125.591	878.559
	Sanacija i rekonstrukcija ceste M15, dionica granica entiteta Sanski Most 1 - Kamičak	Sanski Most	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - javne investicije	992.629	768.797		768.797
				Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	7.371	7.371		7.371
	Sanacija i rekonstrukcija ceste M15, dionica granica entiteta Sanski Most 1 - Kamičak					1.000.000	776.168		776.168
	Program modernizacije magistralnih cesta u F BiH - Sanacija šteta nakon poplava	Federacija Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	1.322.929	1.322.929	47.150	1.370.079
			Ino sredstva	Kredit	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	25.150.390	20.317.390	264.085	20.581.475
	Program modernizacije magistralnih cesta u F BiH - Sanacija šteta nakon poplava					26.473.319	21.640.319	311.235	21.951.554
	Program modernizacije magistralnih cesta u F BiH - Poboljšanje elemenata u postojećem koridoru	Više općina Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Grant	Budžet FBIH - javne investicije	850.767	850.767	323.741	1.174.508
				Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	4.721.986	4.284.068	982.918	5.266.986
			Ino sredstva	Kredit	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	30.397.686	18.697.686	5.661.405	24.359.091
	Program modernizacije magistralnih cesta u F BiH - Poboljšanje elemenata u postojećem koridoru					35.970.439	23.832.521	6.968.064	30.800.585
	Program modernizacije magistralnih cesta u F BiH - Izgradnja obilaznica	Federacija Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - GSM licenca	1.865.588	1.865.588		1.865.588
Vlastita sredstva				Javna preduzeća - vlastito učešće	9.959.353	9.825.353	268.103	10.093.456	
Ino sredstva			Kredit	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	23.695.450	6.695.610	11.245.702	17.941.312	
Program modernizacije magistralnih cesta u F BiH - Izgradnja obilaznica					35.520.391	18.386.551	11.513.805	29.900.356	

Implementator	Naziv projekta	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u tekućoj godini	Utrošeno ukupno do 31.12.2023.	
JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine	Električna distribucija BiH	Više općina Hercegovačko-neretvanskog kantona	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	1.475.414	1.475.414		1.475.414	
			Ino sredstva	Kredit	Europska investiciona banka (EIB)	1.931.951				
		Više općina Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	7.975.551	7.975.551		7.975.551	
			Ino sredstva	Kredit	Europska investiciona banka (EIB)	8.669.254				
		Više općina Tuzlanskog kantona	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	11.034.338	11.034.338		11.034.338	
			Ino sredstva	Kredit	Europska investiciona banka (EIB)	7.057.069				
		Više općina Unsko-sanskog kantona	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	3.434.789	3.434.789		3.434.789	
			Ino sredstva	Kredit	Europska investiciona banka (EIB)	4.443.366				
		Više općina Zeničko-dobojskog kantona	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	5.417.358	5.417.358		5.417.358	
			Ino sredstva	Kredit	Europska investiciona banka (EIB)	7.235.810				
	Električna distribucija BiH						58.674.900	29.337.450		29.337.450
	HE Janjići - na rijeci Bosni -15,75 MW	Zenica	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	135.218.078	5.812.250	452.215	6.264.465	
			Ino sredstva	Grant	Njemački kreditni zavod za obnovu F/M (KfW)	1.684.486	1.684.486		1.684.486	
	HE Janjići - na rijeci Bosni -15,75 MW						136.902.564	7.496.736	452.215	7.948.951
	Izgradnja bloka 7-450 MW TE Tuzla	Tuzla	Domaća sredstva	Kredit	Ostala domaća sredstva	141.279.380	141.279.380		141.279.380	
				Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	470.802.132	165.168.766	3.695.341	168.864.107	
			Ino sredstva	Kredit	Izvozno-uvozna banka Kine (CEXIM BANK)	1.200.860.062				
	Izgradnja bloka 7-450 MW TE Tuzla						1.812.941.574	306.448.146	3.695.341	310.143.487
	Izgradnja HE Vranduk na rijeci Bosni - 20 MW	Zenica	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	146.687.265	20.681.325	296	20.681.621	
	Izgradnja HE Vranduk na rijeci Bosni - 20 MW						146.687.265	20.681.325	296	20.681.621
	HE Una Kostela - nastavak rekonstrukcije i proširenje	Bihać	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	10.485.748	1.053.354	5.950	1.059.304	
				Ino sredstva	Kredit	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	839.534	839.534	839.534	
			Ostala ino sredstva			21.381.164				
	HE Una Kostela - nastavak rekonstrukcije i proširenje						32.706.446	1.892.888	5.950	1.898.838

Implementator	Naziv projekta	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u tekućoj godini	Utrošeno ukupno do 31.12.2023.
JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar	Rehabilitacija i modernizacija crpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina	Čapljina	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	2.933.745			
			Ino sredstva	Kredit	Njemački kreditni zavod za obnovu F/M (KfW)	29.337.450			
	Rehabilitacija i modernizacija crpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina					32.271.195			
	CHE Vrilo	Tomislavgrad	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	20.086.000	1.599.915		1.599.915
			Ino sredstva	Grant	Njemački kreditni zavod za obnovu F/M (KfW)	1.222.394	1.208.700		1.208.700
				Kredit	Ostala ino sredstva	195.583.000			
	CHE Vrilo					216.891.394	2.808.615		2.808.615

Implementator	Naziv projekta	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u tekućoj godini	Utrošeno ukupno do 31.12.2023.
JP BH-Gas	Gasifikacija Srednjobosanskog kantona, I faza: Gasovod Zenica - Travnik	Federacija Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	16.794.779	10.316.464	567.659	10.884.123
			Ino sredstva	Grant	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	648.215	648.215		648.215
				Kredit	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	28.954.176	28.954.176		28.954.176
	Gasifikacija Srednjobosanskog kantona, I faza: Gasovod Zenica -Travnik					46.397.170	39.918.855	567.659	40.486.514
	Studija izvodljivosti (ESIA, CBA i Idejni projekat) za Regionalni gasovod „Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Hrvatske“	Federacija Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	20.695	10.695		10.695
			Ino sredstva	Grant	Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)	755.753	755.753		755.753
					Europska komisija (EC)	275.772	275.772		275.772
					Europska unija (EU)	2.955.259	2.955.259		2.955.259
	Studija izvodljivosti (ESIA, CBA i Idejni projekat) za Regionalni gasovod „Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Hrvatske“					4.007.479	3.997.479		3.997.479

Implementator	Naziv projekta	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u tekućoj godini	Utrošeno ukupno do 31.12.2023.
JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine	Regionalni projekat obnove željeznica u BiH /Željeznice II/	Federacija Bosne i Hercegovine	Ino sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	12.712.895	12.347.532		12.347.532
				Kredit	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	82.144.860	73.276.448		73.276.448
					Europska investiciona banka (EIB)	100.920.828	100.920.828		100.920.828
					OPEC fond za međunarodni razvoj (OFID)	20.878.969	20.702.306		20.702.306
	Regionalni projekat obnove željeznica u BiH /Željeznice II/					216.657.552	207.247.114		207.247.114

Implementator	Naziv projekta	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u tekućoj godini	Utrošeno ukupno do 31.12.2023.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	Projekat razvoja navodnjavanja	Bihać	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	261.310	261.310		261.310
					Budžet FBiH - javne investicije	471.191	3.460	47.748	51.208
			Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka - Međunarodna asocijacija za razvoj (WB IDA)	1.500.362	1.500.362		1.500.362
		Federacija Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	54.829	54.829		54.829
					Budžet FBiH - javne investicije	1.875.423	1.274.418	411.005	1.685.423
			Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka - Međunarodna asocijacija za razvoj (WB IDA)	1.690.393	1.690.393		1.690.393
		Foča-Ustikolina	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje	113.108	113.108		113.108
					Budžet FBiH - javne investicije	111.268	61.268		61.268
			Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka - Međunarodna asocijacija za razvoj (WB IDA)	952.481	952.481		952.481
		Goražde	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje	118.625	118.625		118.625
					Budžet FBiH - javne investicije	40.765	40.765		40.765
			Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka - Međunarodna asocijacija za razvoj (WB IDA)	924.683	924.683		924.683
		Odžak	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje	815.500	815.500		815.500
					Budžet FBiH - javne investicije	26.313	26.313		26.313
			Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka - Međunarodna asocijacija za razvoj (WB IDA)	5.329.897	5.329.897		5.329.897
		Sanski Most	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje	5.190	5.190		5.190
					Budžet FBiH - javne investicije	375.560	23.957		23.957
			Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka - Međunarodna asocijacija za razvoj (WB IDA)	165.171	165.171		165.171
		Čapljina	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje	783.580	783.580		783.580
					Budžet FBiH - javne investicije	43.899	43.899		43.899
			Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka - Međunarodna asocijacija za razvoj (WB IDA)	4.668.656	4.668.656		4.668.656
		Široki Brijeg	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje	419.505	419.505		419.505
					Budžet FBiH - javne investicije	494.452	494.452		494.452
			Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka - Međunarodna asocijacija za razvoj (WB IDA)	5.179.083	5.179.083		5.179.083
		Žepče	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje	443.435	443.435		443.435
					Budžet FBiH - javne investicije	217.217	213.356	3.861	217.217
			Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka - Međunarodna asocijacija za razvoj (WB IDA)	2.746.310	2.746.310		2.746.310
		Živinice	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje pro	159.563	159.563		159.563
					Budžet FBiH - javne investicije	122.969	122.969		122.969
			Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka - Međunarodna asocijacija za razvoj (WB IDA)	1.793.649	1.793.649		1.793.649
	Projekat razvoja navodnjavanja						31.904.387	30.430.187	462.614

Implementator	Naziv projekta	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u tekućoj godini	Utrošeno ukupno do 31.12.2023.
Ured za koordinaciju projekata u poljoprivredi	Projekt razvoja ruralnog poduzetništva i poljoprivrede (READP)	Federacija Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	4.948.250			
			Ino sredstva	Kredit	Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede (IFAD)	13.812.463	3.331.078	3.318.735	6.649.813
	Projekt razvoja ruralnog poduzetništva i poljoprivrede (READP)					18.760.713	3.331.078	3.318.735	6.649.813

Implementator	Naziv projekta	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u tekućoj godini	Utrošeno ukupno do 31.12.2023.
Hrvatska pošta Mostar	Izgradnja Poštanskog logističkog središta HP d.o.o.Mostar-Bišće Polje	Mostar	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	2.107.864	1.853.182		1.853.182
			Domaća sredstva	Kredit	Ostala domaća sredstva	7.000.000	7.000.000		7.000.000
	Izgradnja Poštanskog logističkog središta HP d.o.o.Mostar-Bišće Polje					9.107.864	8.853.182		8.853.182

Implementator	Naziv projekta	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u tekućoj godini	Utrošeno ukupno do 31.12.2023.
Federalno ministarstvo zdravstva	Hitni projekat COVID-19 za BiH	Federacija Bosne i Hercegovine	Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka (WB) osim IDA	38.842.600	36.647.793		36.647.793
	Hitni projekat COVID-19 za BiH					38.842.600	36.647.793		36.647.793

Implementator	Naziv projekta	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u tekućoj godini	Utrošeno ukupno do 31.12.2023.
Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini - dodatno finansiranje	Federacija Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	8.550.850		186.872	186.872
				Vlastita sredstva	Ostala domaća sredstva	4.214.937	1.111.401	2.219.331	3.330.732
			Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka - Međunarodna asocijacija za razvoj (WB IDA)	18.207.219	9.016.138	4.021.419	13.037.557
		Više općina Hercegovačko-neretvanskog kantona	Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka (WB) osim IDA	546.977	113.445	433.532	546.977
		Više općina Kantona Sarajevo	Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka (WB) osim IDA	2.528.400	2.049.348	479.052	2.528.400
		Više općina Zeničko-dobojskog kantona	Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka (WB) osim IDA	10.646.872	10.159.844	487.028	10.646.872
		Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini - dodatno finansiranje					44.695.255	22.450.176	7.827.234
	Energetska efikasnost u javnim objektima u Federaciji BiH	Federacija Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - potrošačka jedinica	3.158.665		82.121	82.121
			Ino sredstva	Grant	Njemački kreditni zavod za obnovu F/M (KfW)	18.580.385	12.079	795.653	807.732
	Energetska efikasnost u javnim objektima u Federaciji BiH						21.739.050	12.079	877.774

Implementator	Naziv projekta	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u tekućoj godini	Utrošeno ukupno do 31.12.2023. godine
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica	Saudijski Fond za razvoj - Rekonstrukcija i obnova	Federacija Bosne i Hercegovine	Ino sredstva	Kredit	Saudijski fond za razvoj	13.185.693	9.643.946	1.516.484	11.160.430
	Saudijski Fond za razvoj - Rekonstrukcija i obnova					13.185.693	9.643.946	1.516.484	11.160.430
	Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja	Federacija Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	978.463	684.253	42.475	726.728
			Ino sredstva	Kredit	Razvojna banka vijeća Europe (CEB)	79.060.913	43.938.489	14.487.346	58.425.835
	Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja					80.039.376	44.622.742	14.529.821	59.152.563

TROŠKOVI JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKATA

Uredbom je propisano da poslove implementacije projekata od značaja za Federaciju, koje je odobrila Vlada Federacije, u skladu sa unutrašnjom organizacijom i nadležnostima federalnog ministarstva, federalne uprave, kantonalnog ministarstva, kantonalne uprave, jedinice lokalne samouprave, agencije ili javnog preduzeća, vrše jedinice za upravljanje projektom. Samo iznimno, u slučaju velikog obima aktivnosti i kompleksnosti projekta, dozvoljen je angažman određenog broja stručnjaka sa specifičnim znanjima i kompetencijama kojima ne raspolaže jedinica za upravljanje projektom. U toku realizacije projekta, osim ulaganja u radove, usluge i robu koja se odnosi na sam projekat, nastaju fiksni troškovi jedinica za implementaciju projekta koji ne predstavljaju ulaganje u projekat, a plaćaju se sredstvima kredita ili se sufinansiraju iz Budžeta Federacije BiH.

Troškovi jedinica za implementaciju projekata koji ne predstavljaju ulaganje u projekat³

Implementator	Naziv projekta	Vrsta troška	Izvor finansiranja	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u 2023. godini	Ukupno utrošeno do 31.12. 2023.
Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini - dodatno finansiranje	Ugovori o djelu za osoblje Jedinica za upravljanje projektom-konsultanti	Svjetska banka - (WB IDA)	850.682	304.712	1.155.394
		Troškovi registracije, osiguranja i održavanja vozila, i troškovi za gorivo	Svjetska banka - (WB IDA)	18.769	6.855	25.624
		Reprezentacija, ugostiteljske i hotelske usluge	Svjetska banka - (WB IDA)	8.061	0	8.061
Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini - dodatno finansiranje				877.512	311.567	1.189.079
Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Energetska efikasnost u javnim objektima u Federaciji BiH	Ugovori o djelu za osoblje Jedinica za upravljanje projektom-konsultanti	KFW- grant	12.079	35.940	48.019
Energetska efikasnost u javnim objektima u Federaciji BiH				12.079	35.940	48.019
Federalna uprava za geodetsko i imovinsko-pravne poslove	Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina	Ugovori o djelu za osoblje Jedinica za upravljanje projektom-konsultanti	Svjetska banka - (WB IDA)	490.074	329.212	819.286
		Fiksna i mobilna telefonija	Svjetska banka - (WB IDA)	1.561	715	2.276
		Troškovi registracije, osiguranja i održavanja vozila, i troškovi za gorivo	Svjetska banka - (WB IDA)	5.031	1.430	6.461
Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina				496.666	331.357	828.023
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH	Ugovori o djelu za osoblje jedinice za upravljanje projektom-konsultanti	Budžet FBIH - Sufinansiranje projekata	241.762	35.507	277.269
Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH				241.762	35.507	277.269
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica	Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja	Ugovori o djelu za osoblje jedinica za upravljanje projektom-konsultanti	Budžet FBIH - Sufinansiranje projekata	509.553	34.712	544.265
Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja				509.553	34.712	544.265
Ured za koordinaciju projekata u poljoprivredi	Projekt razvoja ruralnog poduzetništva i poljoprivrede (READP)	Fiksna i mobilna telefonija	IFAD	5.908	7.048	12.956
		Plaće (uključujući poreze i doprinose) za osoblje Jedinica za upravljanje projektom	IFAD	402.608	471.956	874.564
		Reprezentacija, ugostiteljske i hotelske usluge	IFAD	5.447	2.791	8.238
		Topli obrok, prevoz, regres, jubilarne nagrade, isplate povodom praznika	IFAD	17.120	32.708	49.828
		Troškovi poslovnog prostora	IFAD	58.057	72.307	130.364
		Troškovi registracije, osiguranja i održavanja vozila, i troškovi za gorivo	IFAD	14.750	11.694	26.444
		Ugovori o djelu za osoblje Jedinica za upravljanje projektom-konsultanti	IFAD	59.200	73.472	132.672
Projekt razvoja ruralnog poduzetništva i poljoprivrede (READP)				563.090	671.976	1.235.066

³ Izvor: resorna ministarstva - implementatori projekata

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	Projekat razvoja navodnjavanja	Plaće (uključujući poreze i doprinose) za osoblje Jedinica za upravljanje projektom	Svjetska banka - Kredit	532.445		532.445
		Fiksna i mobilna telefonija	Svjetska banka - Kredit	7.365		7.365
		Reprezentacija, ugostiteljske i hotelske usluge	Svjetska banka - Kredit	4.861		4.861
		Topli obrok, prevoz, regres, jubilarne nagrade, isplate povodom praznika	Svjetska banka - Kredit	51.053		51.053
		Troškovi poslovnog prostora	Svjetska banka - Kredit	44.780		44.780
		Troškovi registracije, osiguranja i održavanja vozila, i troškovi za gorivo	Svjetska banka - Kredit	8.362		8.362
		Ugovori o djelu za osoblje Jedinica za upravljanje projektom-konsultanti	Svjetska banka - Kredit	48.053		48.053
		Plaće (uključujući poreze i doprinose) za osoblje Jedinica za upravljanje projektom	Budžet FBiH	806.561	304.057	1.110.618
		Fiksna i mobilna telefonija	Budžet FBiH	6.514	1.122	7.636
		Reprezentacija, ugostiteljske i hotelske usluge	Budžet FBiH	6.239	46	6.285
		Topli obrok, prevoz, regres, jubilarne nagrade, isplate povodom praznika	Budžet FBiH	73.679	27.023	100.702
		Troškovi poslovnog prostora	Budžet FBiH	79.708	8.274	87.982
		Troškovi registracije, osiguranja i održavanja vozila, i troškovi za gorivo	Budžet FBiH	22.058	4.083	26.141
		Ugovori o djelu za osoblje Jedinica za upravljanje projektom-konsultanti	Budžet FBiH	107.460	58.356	165.816
Projekat razvoja navodnjavanja				1.799.138	402.961	2.202.099

Kao i prethodnih godina, nastavljena je praksa da se na teret troškova projekta iz kredita ili kao sufinansiranje iz Budžeta Federacije BiH projektnom osoblju vrši isplata plaća, regresa, jubilarnih naknada i slično, pri čemu mjesečni troškovi po ovom osnovu značajno variraju između ministarstava. Iako su, u skladu sa Uredbom, projektni timovi tj. jedinice za implementaciju projekata trebale biti organizacijska jedinica u okviru nadležnog federalnog ministarstva, u okviru Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i dalje egzistira više jedinica za realizaciju projekata, pri čemu su neke organizacijski izvan ministarstva što nije u skladu sa Uredbom. Ovakva situacija stvara brojne probleme kako u pogledu kontrole i ispravnog evidentiranja projektnih rashoda i imovine koja se nabavlja u okviru projekta, tako i u pogledu dosljedne primjene Zakona o trezoru u Federaciji BiH, Zakona o unutrašnjem platnom prometu, Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, Zakona o Budžetima u Federaciji BiH i ostalih pozitivnih propisa.

ODSTUPANJE REALIZACIJE PROJEKATA OD PLANA

S obzirom da je tokom godina realizacija projekata značajno odstupala od ulaganja planiranih Programom javnih investicija Federacije BiH, Vlada Federacije je, svojim Zaključkom V broj: 1085/2017 od 27.07.2017. godine, obavezala implementirajuće agencije/institucije da, osim redovnog kvartalnog ažuriranja podataka u PIMIS sistemu, Federalnom ministarstvu dostavljaju i Izvještaj o realizaciji projekata za koje su nadležni, sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja i o eventualnim zastoјima u realizaciji projekata.

S tim u vezi, implementatori su, na zahtjev Federalnog ministarstva finansija, na posebnom obrascu dostavili Izvještaj o napretku projekta koji sadrže podatke o planiranim i provedenim aktivnostima (PRILOG 1.)
